

災害関連緊急砂防・急傾斜地崩壊対策事業について

令和2年7月豪雨により土石流が発生した7箇所（芦北町6箇所、津奈木町1箇所）、及び人家裏の斜面崩壊が発生した3箇所（芦北町）について、令和4年度迄の対策完了を目指し、災害関連緊急砂防・急傾斜地崩壊対策事業に取り組んでいます。

<2022年2月末現在の状況>

【災害関連緊急砂防事業（7箇所）】

工事中：1箇所

工事着手準備中：3箇所

入札公告中：2箇所

用地交渉中：1箇所

【災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業（3箇所）】


工事中：1箇所

工事着手準備中：1箇所

対策完了(※)：1箇所 (※)付帯工事は継続

事業箇所

砂防 7箇所
急傾斜 3箇所
計 10箇所

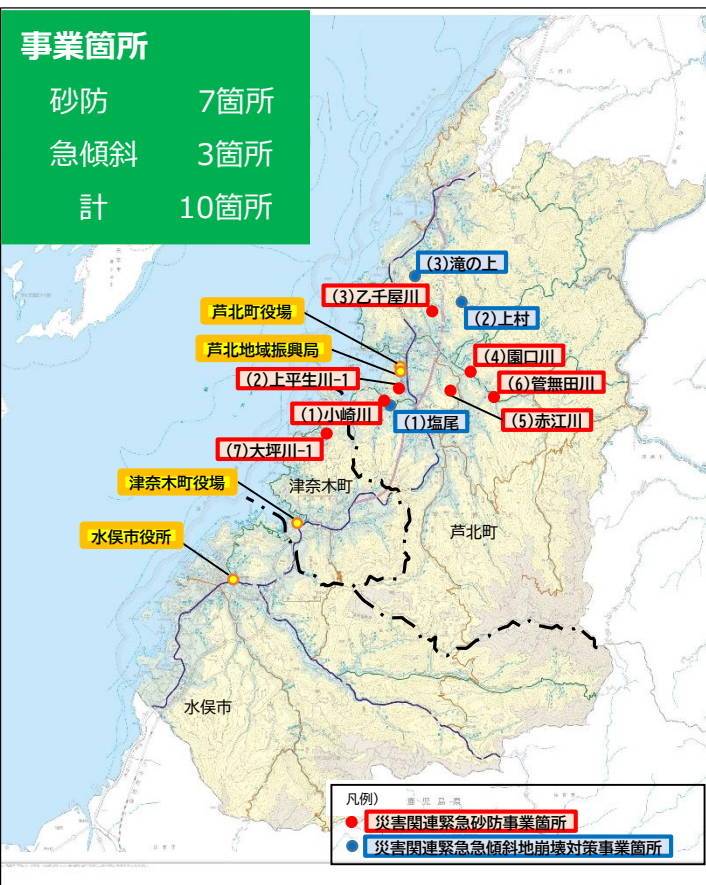


事業の進捗状況

(砂防) 大坪川 1



(急傾斜) 塩尾

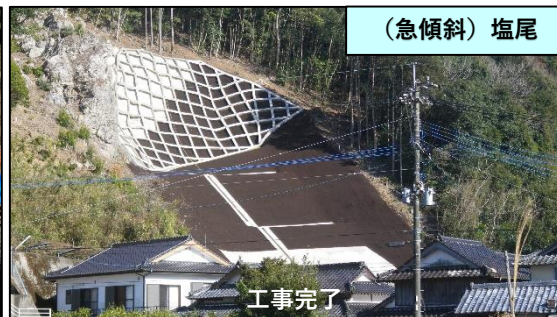

事業種別	溪流 または区域名	施行箇所	対策工法	2月末現在の状況	対策完了見込み
砂防	(1) 小崎川	芦北町女島	えん堤1基	入札公告中	令和4年度未完了見込み※
	(2) 上平生川-1	芦北町女島	えん堤1基	入札公告中	令和4年度未完了見込み※
	(3) 乙千屋川	芦北町乙千屋	えん堤1基・付替道路	工事着手準備中	令和4年度未完了見込み※
	(4) 園口川	芦北町八幡	えん堤1基・付替道路	工事着手準備中	令和4年度未完了見込み※
	(5) 赤江川	芦北町田川	えん堤1基・溪流保全工・付替道路	用地交渉中	令和4年度未完了見込み※
	(6) 管無田川	芦北町桑原	えん堤1基	工事着手準備中	令和4年度未完了見込み
	(7) 大坪川-1	津奈木町福浜	えん堤1基	工事中	令和4年度未完了見込み※
急傾斜	(1) 塩尾	芦北町女島	斜面対策（法枠・鉄筋挿入工）	工事完了	対策完了※
	(2) 上村	芦北町伏木氏	斜面対策（法枠工）	工事中	令和4年度8月完了見込み
	(3) 滝の上	芦北町海浦	斜面対策（法枠工）	工事着手準備中	令和4年度未完了見込み

※付帯工事は継続
