


熊本都市圏の交通ネットワークの整備に関する実行計画
都市圏総合交通戦略（アクションプラン）の進捗状況

～令和3年度末（2021年度末）の事業進捗～

1 概要





○ 「アクションプラン」は、3つの基本施策の「公共交通」、「道路」、「まちなか交通」に位置づけられた個々の施策について、事業主体や実施時期等を明記し、相互連携のもと、進捗管理を行いながら、計画的に推進。

また、3つの基本施策を横断的・戦略的に組み合わせることで、相乗的に効果を発揮する施策をパッケージ化し、連携パッケージとして一体的に推進。

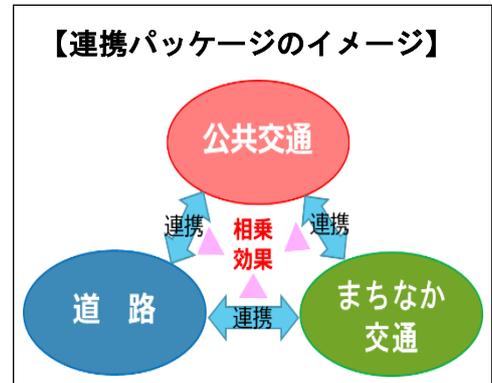

2 進捗状況（令和3年度末）

- 令和3年度末の進捗状況は、全実施施策 218 施策のうち、70 施策が完了。
- 「短期」は、約9割の 50 施策が完了。7 施策が未完了で、早期完了を目指して実施中。
- 「中期」の 12 施策及び「中長期以降」の 8 施策は、令和5年度以降の完了から前倒して完了。

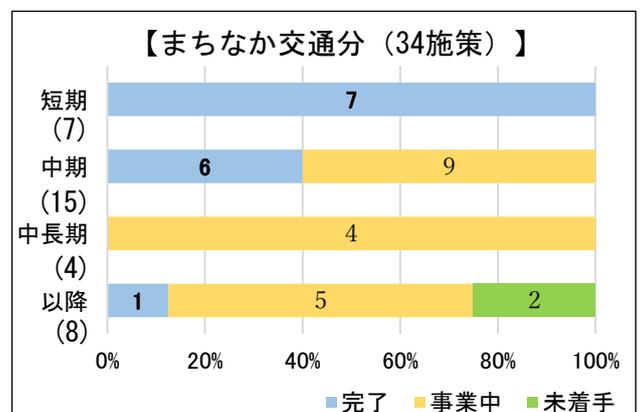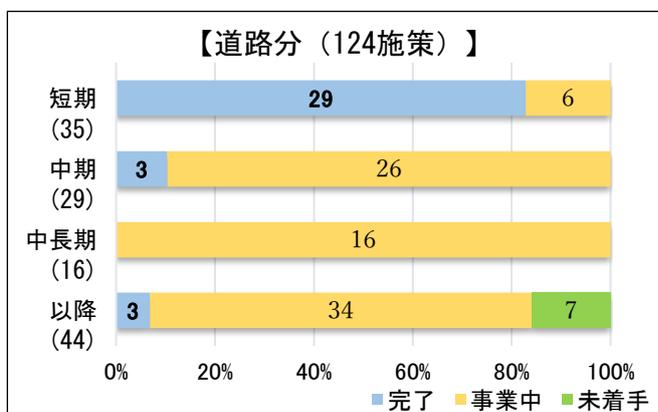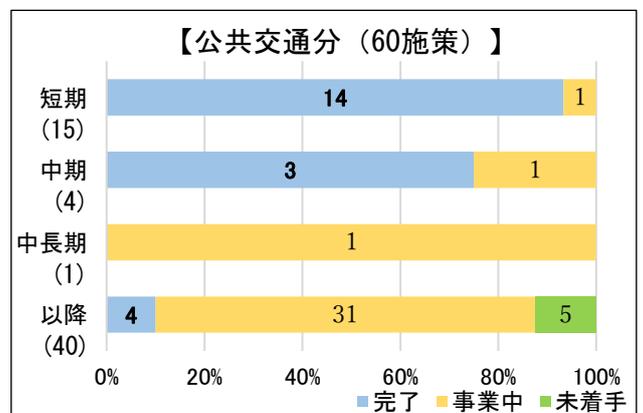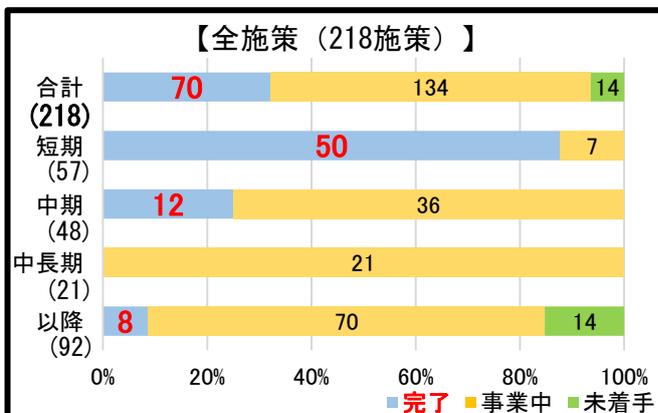

【参考】 短期：令和2年度迄に完了する施策
 中長期：令和7年度迄に完了する施策

中期：令和5年度迄に完了する施策
 以降：令和7年度迄に着手する施策

3 短期の未完了施策（7 施策）

○ 短期施策の未完了は、用地取得の期間増や熊本地震からの復旧工事の優先等が主な理由であり、今後早期完了を目指して実施中。

分野	施策No.	施策名	実施主体 関係者	未完了の理由	完了予定
公共交通	14	空港アクセスの改善(新交通システムの検討)	熊本県	周辺の立地条件の変化等により検討に時間を要したため	R4
道路	110	県道御船甲佐線(滝川工区 御船町滝川)整備	熊本県	用地取得に期間を要しているため	R4
	124	市道川尻町下無田第1号線 (熊本市南区元三4丁目～熊本市東区画図町下無田)整備	熊本市	交差点計画見直しに伴い事業に遅れが生じたため	R9
	150	市道御代志木原野線(合志市御代志～野々島)整備	合志市	雨水の排水処理施設の整備を追加したため	R4
	159	仮称・松橋駅西線(宇城市不知火町高良)整備	宇城市	用地取得に期間を要しているため	R5
	168	町道西寒野打越線(甲佐町西寒野～東寒野)整備	甲佐町	熊本地震に伴う復旧工事を優先したため	R4
	169	町道上揚井戸江線(甲佐町上揚～安平)整備	甲佐町	熊本地震に伴う復旧工事を優先したため	R4

4 完了施策による効果事例

■連携パッケージ【道路×まちなか交通】

(道 路) 県道熊本高森線 ((都) 熊本駅城山線) 整備 No. 120
 (まちなか交通) 熊本駅白川口駅前広場の整備 No. 193
 サイクル&ライド用の駐輪場整備 (熊本駅) No. 201

駅前広場や駐輪場の整備により、広域交通結節点の機能強化や、JR とバス・市電との乗換えの利便性を向上し、公共交通機関の利用促進を図りました。

また、快適な歩行空間の確保を図ったことで、交流人口の拡大や災害時の一時避難スペースとしての利活用が期待されます。



熊本駅白川口駅前広場の整備

■連携パッケージ【公共交通×道路】

(公共交通) 交通結節点の整備(松橋駅前広場) No. 12

(道路) 国道266号(松橋工区(宇城市松橋町松橋)松橋交差点)改良 No. 86

松橋駅前広場の整備と駅東側の国道266号松橋交差点の改良により、交通結節点の機能強化やアクセス改善を図りました。



交通結節点の整備(松橋駅前広場)




国道266号(松橋交差点)の改良

■道路【多核連携、防災機能向上等に資する道路整備】

県道熊本嘉島線(上仲間工区 嘉島町上仲間)整備 No. 105

国道266号と県道熊本嘉島線が交差する上仲間交差点において、左折レーンを新たに整備したことで、直進車が左折車により阻害されることなく進行でき、交通渋滞の緩和につながっています。

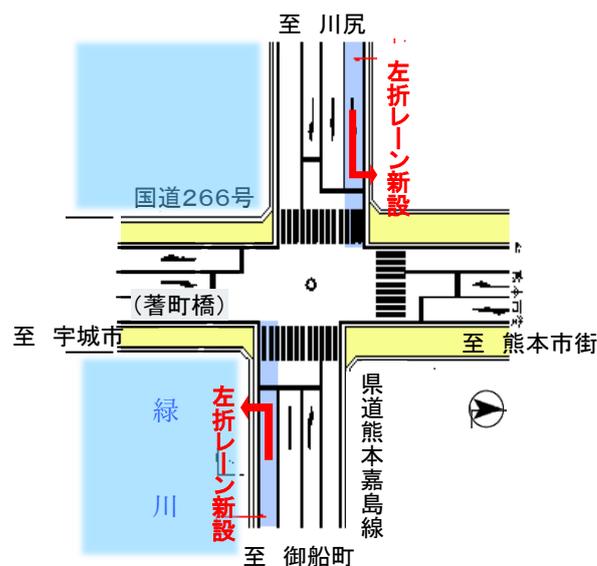

5 完了施策（70 施策）

分野	施策No.	施策名	実施主体 関係者	時期	完了年度
公共交通	6	広域交通拠点：（仮称）熊本桜町バスターミナルの整備	バス事業者	短期	R1
	7	広域交通拠点：熊本駅白川口バスターミナルの整備	熊本市・バス事業者	短期	R2
	8	交通結節点の整備（上熊本駅東口駅前広場）	熊本市	短期	R3
	10	交通結節点の整備(植木駅前広場)	熊本市	短期	R3
	12	交通結節点の整備(松橋駅前広場)	宇城市	短期	R3
	25	合志庁舎と御代志駅とを結ぶバス路線の実証実験	合志市・バス事業者	短期	R2
	26	御代志駅を発着とするバス路線網への再編	合志市・バス事業者	中期	R2
	27	路線バスの利用低迷路線の効率化に向けた見直し	大津町・バス事業者	短期	R2
	28	肥後大津駅の乗り継ぎ機能の強化(路線バス等各交通モードの乗入検討)	大津町・バス事業者	短期	R2
	32	サイクル&ライド用の駐輪場整備(上熊本駅)	熊本市	短期	H30
	33	サイクル&ライド用の駐輪場整備(川尻駅)	熊本市	短期	H30
	34	サイクル&ライド用の駐輪場整備(植木駅)	熊本市	中期	R3
	35	サイクル&ライド用の駐輪場整備(交通結節点)	熊本市	以降	R3
	39	電停の改良(辛島町電停)	熊本市	中期	R3
	40	電停の改良(動植物園入口電停等)	熊本市	以降	R3
	45	公共交通案内情報の提供(バスロケーションシステムの導入)	バス事業者・熊本市	短期	R1
	54	バス停名称及びび行先案内記号の統一(多言語対応・ナンバリング)	バス事業者・熊本県	短期	R1
	57	車内停名表示器(OBCビジョン)への更新(四ヶ国語表示)	熊本市	短期	H30
	58	路面電車運行情報の提供(ロケーションシステムの導入)	熊本市	短期	H30
	59	路面電車運行情報の提供(四ヶ国語対応路線図の作成・配布)	熊本市	以降	H30
60	路面電車運行情報の提供(ホームページに路線図・時刻表の掲載)	熊本市	以降	H30	
まちなか 交通	192	広域交通拠点：再開発による（仮称）熊本桜町バスターミナルの整備	バス事業者	短期	R1
	193	広域交通拠点：熊本駅白川口駅前広場の整備	熊本市	短期	R2
	194	JRの鉄道高架化	熊本県・JR	短期	H30
	195	公共交通と連携した中心部における駐車場のあり方検討 (駐車場整備計画の策定、附置義務条例の見直し等)	熊本市	中期	R3
	197	市電軌道の緑化(花畑町電停～辛島町電停)	熊本市	中期	R3
	198	民間の交通券配布に関する周知広報	バス事業者	以降	H30
	199	シンボルプロムナード等の整備	熊本市	中期	R3
	201	サイクル&ライド用の駐輪場整備（熊本駅）	熊本市	短期	R2
	202	県道熊本玉名線(熊本市中央区南坪井町～坪井1丁目)自転車走行空間整備	熊本市	短期	H30
	203	市道子飼本町大江6丁目第1号線(熊本市中央区 大江渡鹿交差点～子飼橋) 自転車走行空間整備	熊本市	短期	R1
204	白川河川堤防を活用した自転車歩行者専用道路等の整備(大甲橋～明午橋 右岸)	熊本市	短期	H30	
208	市道段山本町上熊本2丁目第1号線(熊本市西区上熊本2丁目～島崎1丁目)自 転車走行空間整備	熊本市	中期	R1	
210	市道帯山4丁目第1号線(熊本市中央区帯山3丁目～帯山4丁目)自転車走行空 間整備	熊本市	中期	R1	
214	市道千葉城町草葉町第1号線(熊本市中央区城東町～草葉町)自転車走行空 間整備	熊本市	中期	R2	

分野	施策No.	施策名	実施主体 関係者	時期	完了年度
道路	65	国道57号(瀬田拡幅 大津町瀬田)整備	国土交通省	以降	R2
	74	県道砂原四方寄線((都)熊本西環状線 熊本市西区花園7丁目～北区四方寄町)暫定2車線整備	熊本市	短期	H30
	77	県道花園インター線(熊本市西区池亀町～花園7丁目)整備	熊本市	短期	H30
	81	城南スマートインターチェンジ(熊本市南市区城南町塚原)整備	熊本市・NEXCO	短期	H30
	82	北熊本スマートインターチェンジ(熊本市北区改寄町～植木町石川)整備	熊本市・NEXCO	短期	H30
	86	国道266号(松橋工区 宇城市松橋町松橋 松橋交差点)改良	熊本県	短期	R1
	91	国道266号(熊本市南区出仲間8丁目～田井島交差点)改良	熊本市	中期	R2
	93	県道熊本高森線(熊本市西区田崎1丁目 田崎町交差点)改良	熊本市	短期	R2
	99	道路標識の設置改善による交通円滑化	熊本市	以降	R3
	100	既存案内標識への高速道路ナンバリング	国土交通省・熊本県 熊本市・宇城市・益城町	短期	R2
	104	県道小池竜田線(小池工区 益城町小池)整備	熊本県	短期	R1
	105	県道熊本嘉島線(上仲間工区 嘉島町上仲間)整備	熊本県	短期	R1
	106	県道八代鏡宇土線(新松原工区 宇土市新松原町)整備	熊本県	短期	R2
	107	県道田代御船線(上野2工区 御船町田代)整備	熊本県	短期	R2
	111	県道住吉熊本線(上庄工区 合志市上庄)整備	熊本県	中期	R2
	120	県道熊本高森線((都)熊本駅城山線 熊本市西区田崎本町～田崎2丁目)整備	熊本市	短期	R2
	121	県道熊本玉名線(熊本市西区河内町)整備	熊本市	以降	R1
	123	市道二本木2丁目新大江1丁目第1号線((都)二本木新大江線 熊本市中央区新大江)整備	熊本市	短期	R2
	127	市道田崎1丁目第1号線他(熊本駅周辺連立側道・交差道路)整備	熊本市	短期	R2
	128	市道春日3丁目第16号線((都)熊本駅南線 熊本市西区春日2丁目～春日5丁目)整備	熊本市	短期	R2
	129	県道並建熊本線((都)春日池上線 熊本市西区春日1丁目～春日3丁目)整備	熊本市	短期	R1
	130	県道熊本田原坂線((都)上熊本法成寺線・野口清水線～崇城大学前)整備	熊本市	短期	H30
	142	市道春日2丁目第8号線(熊本市西区春日2丁目)整備	熊本市	短期	R2
	149	市道福原・原水線(合志市福原～大津町原水)整備	合志市	短期	R1
	151	市道永熊本線(合志市御代志～豊岡)整備	合志市	中期	R3
	153	町道古閑原上堀川線(原水工区 菊陽町原水)整備	菊陽町	短期	R1
	154	町道新町合志線(原水工区 菊陽町原水)整備	菊陽町	短期	R1
	157	市道長崎久具線(1期 宇城市不知火町長崎～松橋町東松崎)整備	宇城市	短期	R2
	165	町道仁田子古川線(甲佐町大町)整備	甲佐町	短期	R1
	166	町道松ヶ崎妙見谷線(甲佐町糸田～早川)整備	甲佐町	短期	H30
	167	町道吉田県道線(甲佐町吉田～芝原)整備	甲佐町	短期	R1
	176	県道熊本高森線((都)熊本駅城山線 熊本市西区田崎本町～田崎2丁目)無電柱化	熊本市	短期	R2
177	県道並建熊本線((都)春日池上線 熊本市西区春日1丁目～春日3丁目)無電柱化	熊本市	短期	R1	
181	市道春日2丁目第8号線(熊本市西区春日2丁目)無電柱化	熊本市	短期	R2	
182	市道春日3丁目第16号線((都)熊本駅南線 熊本市西区春日2丁目～春日5丁目)無電柱化	熊本市	短期	R2	
